

Zeitplanung Landesgartenschau 2015 bis Eröffnung




Kernbereiche Landesgartenschau (KEB) Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH
Förderung: "Natur in Stadt und Land"

KEB 1-0 Neuer Uferpark West


KEB 1-1 Park-West

	Beginn	Ende	Dauer
Lp 2 Vorentwurf	Jan. 15	Jan. 15	14
Rahmenplan	Jan. 15	Mrz. 15	89
Lp3 Entwurf	Jan. 15	Jun. 15	180
Lp4 Genehmigungsplanung	Jan. 15	Okt. 15	303
Lp5 Ausführungsplanung	Jun. 15	Feb. 16	272
Lp6-7 Ausschreibung	Feb. 16	Jun. 16	150
Lp8 Bauleitung / Bauphase	Sep. 16	Mrz. 20	1277




KEB 1-2 Ufer-West

	Beginn	Ende	Tage
Lp 2 Vorentwurf	Jan. 15	Jan. 15	14
Rahmenplan	Jan. 15	Mrz. 15	89
Lp3 Entwurf	Jan. 15	Jun. 15	180
Lp4 Genehmigungsplanung	Jan. 15	Okt. 15	303
Lp5 Ausführungsplanung	Jun. 15	Feb. 16	272
Lp6-7 Ausschreibung	Feb. 16	Jun. 16	150
Lp8 Bauleitung / Bauphase	Sep. 16	Mrz. 20	1277




KEB 1-3 Ufer-Ost

	Beginn	Ende	Dauer
Lp 2 Vorentwurf	Jan. 15	Jan. 15	14
Rahmenplan	Jan. 15	Mrz. 15	89
Lp3 Entwurf	Jan. 15	Jun. 15	180
Lp4 Genehmigungsplanung	Jan. 15	Okt. 15	303
Lp5 Ausführungsplanung	Jun. 15	Apr. 16	334
Lp6-7 Ausschreibung	Feb. 16	Jun. 16	150
Lp8 Bauleitung / Bauphase	Sep. 17	Mrz. 20	883




KEB 1-4 Zentraler Parkbereich

	Beginn	Ende	Dauer
Lp 2 Vorentwurf	Jan. 15	Jan. 15	14
Rahmenplan	Jan. 15	Mrz. 15	89
Lp3 Entwurf	Jan. 15	Jun. 15	180
Lp4 Genehmigungsplanung	Jan. 15	Okt. 15	303
Lp5 Ausführungsplanung	Sep. 15	Jun. 16	303
Lp6-7 Ausschreibung	Feb. 16	Jun. 17	515
Lp8 Bauleitung / Bauphase	Okt. 17	Mrz. 20	852



KEB 1-5 Park-Ost

	Beginn	Ende	Dauer
Lp 2 Vorentwurf	Jan. 15	Jan. 15	14
Rahmenplan	Jan. 15	Mrz. 15	89
Lp3 Entwurf	Jan. 15	Jun. 15	180
Lp4 Genehmigungsplanung	Jan. 15	Okt. 15	303
Lp5 Ausführungsplanung	Sep. 15	Jun. 16	303
Lp6-7 Ausschreibung	Feb. 16	Jun. 17	515
Lp8 Bauleitung / Bauphase	Okt. 17	Mrz. 20	852




Kernbereiche Verkehrsflächen (KEB) Stadt Überlingen

Förderung: "Radwegebau" / "Renaturierung"

KOB Verlegung Bahnhofstraße

	Beginn	Ende	Dauer
Planungsphase bis Lp 7	Jan. 15	Jan. 16	395
Bauphase ab Lp 8	Feb. 16	Dez. 16	334



Zeitplanung Landesgartenschau 2015 bis Eröffnung




Korrespondenzbereiche "Verkehr" (KOB)

Stadt Überlingen Förderung: "Städtebau"


KOB 3-0 Eingang-Ost

	Beginn	Ende	Dauer
Lp 2 Vorentwurf	Jan. 15	Jan. 15	14
Rahmenplan	Jan. 15	Mrz. 15	89
Lp3 Entwurf	Jan. 15	Jun. 15	180
Lp4 Genehmigungsplanung	Jan. 15	Okt. 15	303
Lp5 Ausführungsplanung	Jun. 15	Apr. 16	334
Lp6-7 Ausschreibung	Feb. 16	Jun. 16	150
Lp8 Bauleitung / Bauphase	Okt. 16	Jul. 17	303

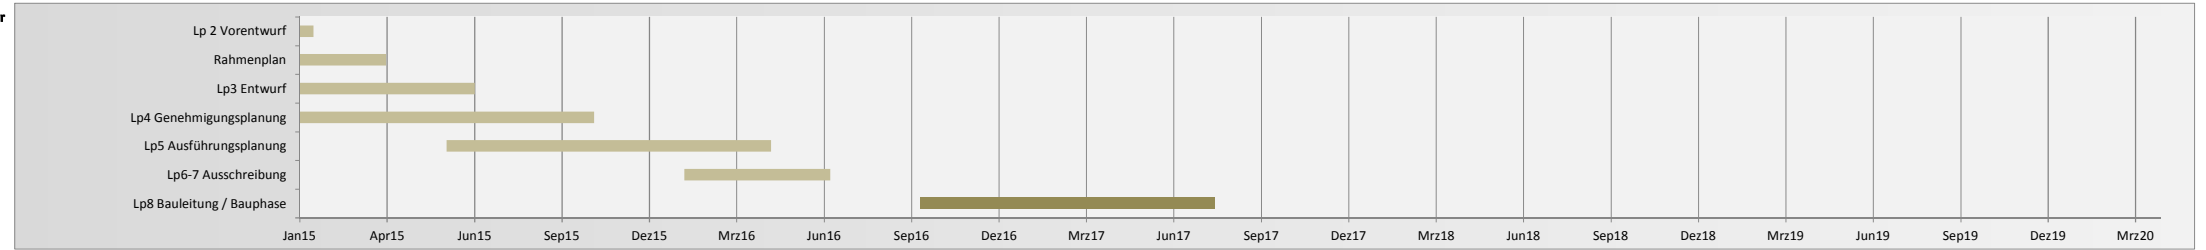


KOB 4-0 Eingang-Ost-Verkehrsflächen

	Beginn	Ende	Dauer
Lp 2 Vorentwurf	Jan. 15	Jan. 15	14
Rahmenplan	Jan. 15	Mrz. 15	89
Lp3 Entwurf	Jan. 15	Jun. 15	180
Lp4 Genehmigungsplanung	Jan. 15	Okt. 15	303
Lp5 Ausführungsplanung	Jun. 15	Apr. 16	334
Lp6-7 Ausschreibung	Feb. 16	Jun. 16	150
Lp8 Bauleitung / Bauphase	Okt. 16	Jul. 17	303

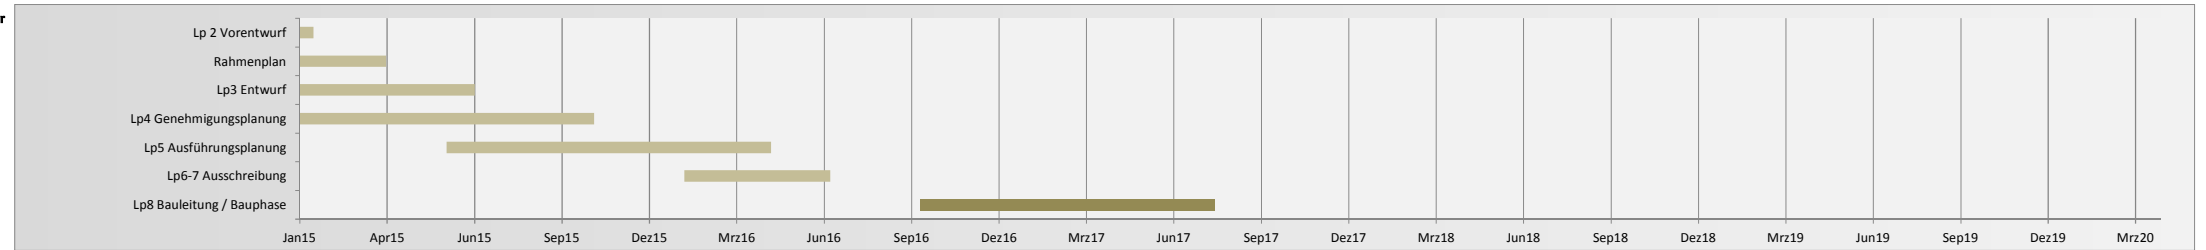

KOB 5-0 Anliegerstraße Villen


	Beginn	Ende	Dauer
Lp 2 Vorentwurf	Jan. 15	Jan. 15	14
Rahmenplan	Jan. 15	Mrz. 15	89
Lp3 Entwurf	Jan. 15	Jun. 15	180
Lp4 Genehmigungsplanung	Jan. 15	Okt. 15	303
Lp5 Ausführungsplanung	Jun. 15	Apr. 16	334
Lp6-7 Ausschreibung	Feb. 16	Jun. 16	150
Lp8 Bauleitung / Bauphase	Apr. 17	Okt. 17	213

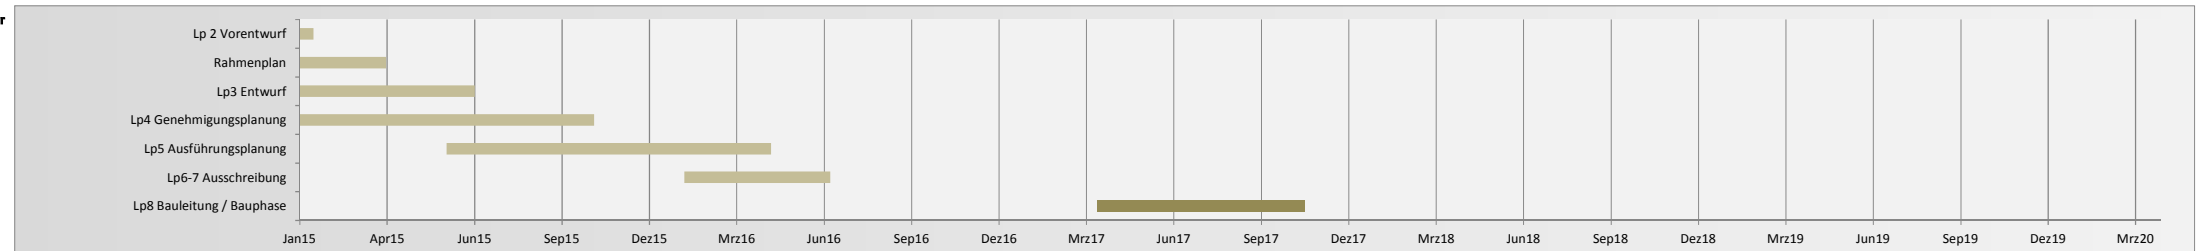

KEB 2-0 Mantelhafen/Ochsengr.


KEB 2-1 Mantelhafen, Westseite

	Beginn	Ende	Dauer
Lp 2 Vorentwurf	Jan. 15	Jan. 15	14
Rahmenplan	Jan. 15	Feb. 15	58
Lp3 Entwurf	Sep. 15	Mrz. 16	212
Lp4 Genehmigungsplanung	Mrz. 16	Aug. 16	153
Lp5 Ausführungsplanung	Aug. 16	Feb. 17	211
Lp6-7 Ausschreibung	Mrz. 17	Jun. 17	121
Lp8 Bauleitung / Bauphase	Okt. 17	Okt. 18	365

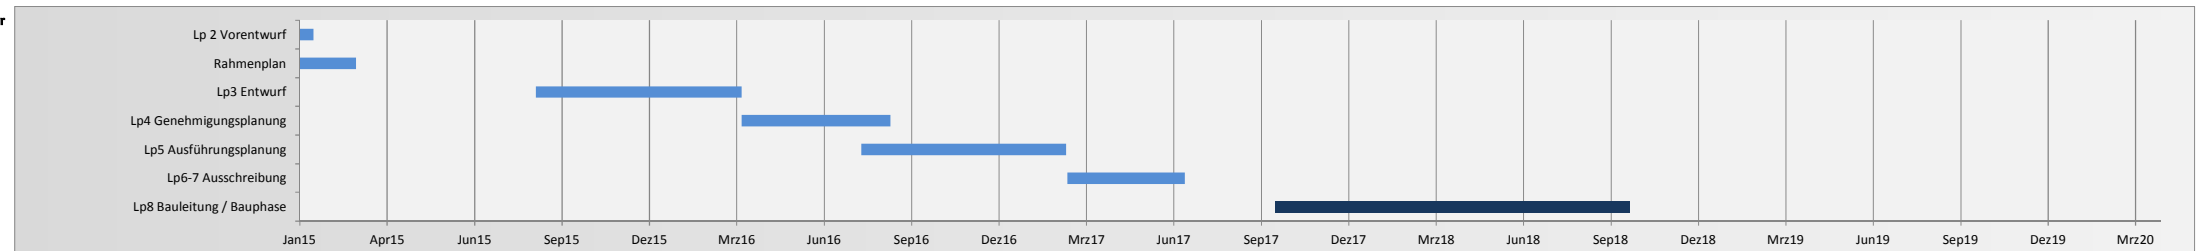


KEB 2-2 Chantilly-Platz

	Beginn	Ende	Dauer
Lp 2 Vorentwurf	Jan. 15	Jan. 15	14
Rahmenplan	Jan. 15	Feb. 15	58
Lp3 Entwurf	Sep. 15	Mrz. 16	212
Lp4 Genehmigungsplanung	Mrz. 16	Aug. 16	153
Lp5 Ausführungsplanung	Aug. 16	Feb. 17	211
Lp6-7 Ausschreibung	Mrz. 17	Jun. 17	121
Lp8 Bauleitung / Bauphase	Okt. 17	Mrz. 18	151

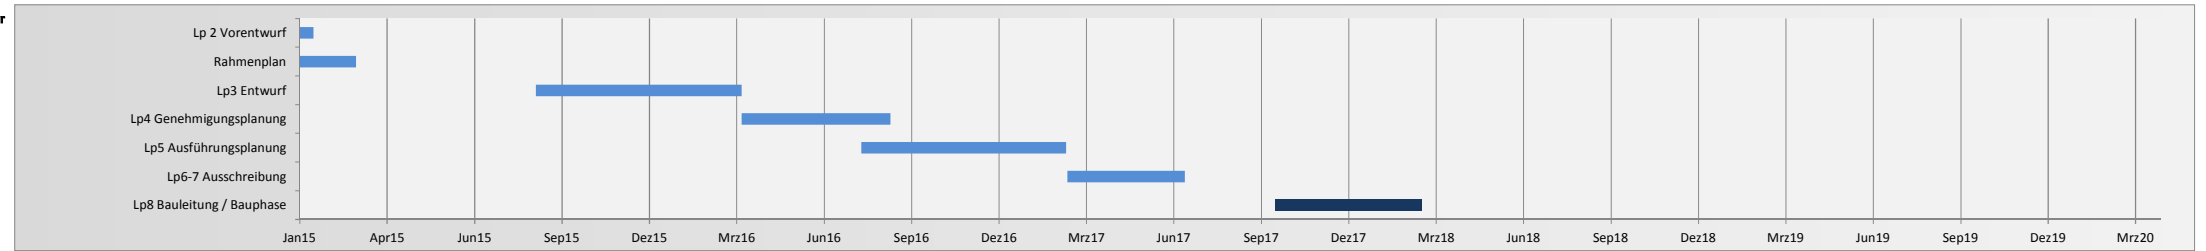

KEB 2-3 Höhensteg Ochsengraben

	Beginn	Ende	Dauer
Lp 2 Vorentwurf	Jan. 15	Jan. 15	14
Rahmenplan	Jan. 15	Feb. 15	58
Lp3 Entwurf	Sep. 16	Apr. 17	241
Lp4 Genehmigungsplanung	Mrz. 17	Dez. 17	276
Lp5 Ausführungsplanung	Jan. 18	Sep. 18	272
Lp6-7 Ausschreibung	Okt. 18	Apr. 19	211
Lp8 Bauleitung / Bauphase	Jul. 19	Mrz. 20	244

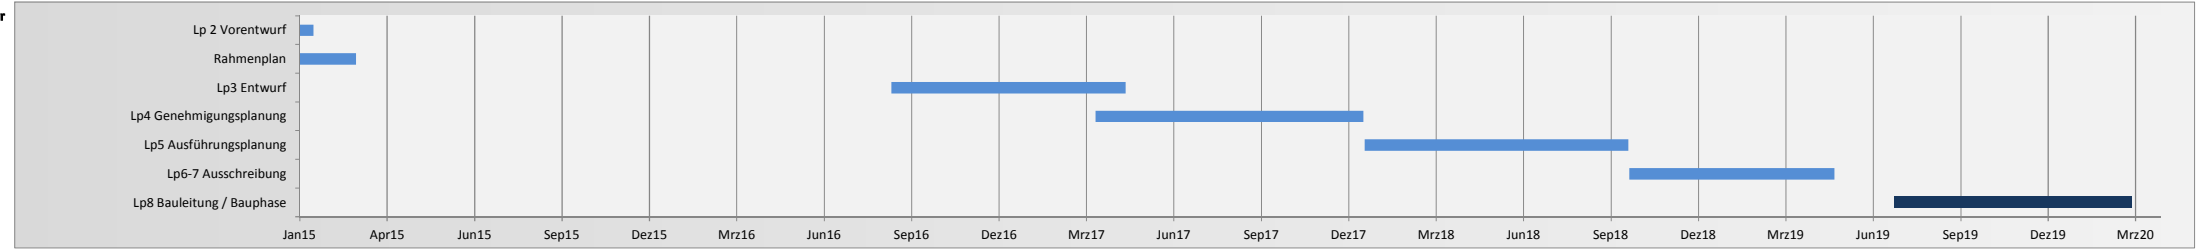

Zeitplanung Landesgartenschau 2015 bis Eröffnung




Korrespondenzbereiche Landesgartenschau (KOB) Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH Förderung: "Städtebau"

KOB 1-0 Uferpromenade


KOB 1-1 Uferpromenade Ost

	Beginn	Ende	Dauer
Lp 2 Vorentwurf	Jan. 15	Jan. 15	14
Rahmenplan	Jan. 15	Feb. 15	58
Lp3 Entwurf	Sep. 15	Mrz. 16	212
Lp4 Genehmigungsplanung	Mrz. 16	Aug. 16	153
Lp5 Ausführungsplanung	Aug. 16	Feb. 17	211
Lp6-7 Ausschreibung	Mrz. 17	Jun. 17	121
Lp8 Bauleitung / Bauphase	Okt. 17	Mrz. 18	151




KOB 1-2 Uferpromenade Landungsplatz

	Beginn	Ende	Dauer
Lp 2 Vorentwurf	Jan. 15	Jan. 15	14
Rahmenplan	Jan. 15	Feb. 15	58
Lp3 Entwurf	Sep. 15	Mrz. 16	212
Lp4 Genehmigungsplanung	Mrz. 16	Aug. 16	153
Lp5 Ausführungsplanung	Aug. 16	Feb. 17	211
Lp6-7 Ausschreibung	Mrz. 17	Jun. 17	121
Lp8 Bauleitung / Bauphase	Okt. 18	Jul. 19	273



KOB 1-3 Uferpromenade West

	Beginn	Ende	Dauer
Lp 2 Vorentwurf	Jan. 15	Jan. 15	14
Rahmenplan	Jan. 15	Feb. 15	58
Lp3 Entwurf	Sep. 15	Mrz. 16	212
Lp4 Genehmigungsplanung	Mrz. 16	Aug. 16	153
Lp5 Ausführungsplanung	Aug. 16	Feb. 17	211
Lp6-7 Ausschreibung	Mrz. 17	Jun. 17	121
Lp8 Bauleitung / Bauphase	Okt. 19	Mrz. 20	152




Korrespondenzbereiche Stadtentwicklung (KOB)

Stadt Überlingen Förderung: "Städtebau" / "Tourismus"


KOB Pflanzenhaus

	Beginn	Ende	Dauer
Planungsphase bis Lp 7	Jan. 15	Sep. 16	638
Bauphase ab Lp 8	Okt. 16	Sep. 17	364



KOB Parkhaus

	Beginn	Ende	Dauer
Planungsphase bis Lp 7	Jan. 15	Mrz. 16	455
Bauphase ab Lp 8	Apr. 16	Feb. 17	333



Ausstellung Landesgartenschau 2020

	Beginn	Ende	Dauer
konzeptionelle Entwicklung	Jan. 16	Jan. 17	396
Planungsphase	Jan. 17	Aug. 19	972
OPB 5-0 Anschluss Höhensteg Planung	Jan. 19	Aug. 19	242
OPB 6-0 Menzinger Gärten Planung	Jan. 18	Aug. 19	607
Organisationsphase	Sep. 18	Mrz. 20	577
Bauphase	Feb. 19	Mrz. 20	424
Ausstellung	Mrz. 20	Okt. 20	214

